



GESTÃO DE PROJETOS

AULA 5





CONVERSA INICIAL

Olá! Nesta aula, a proposta é compreender um pouco mais sobre gerenciamento, controle e execução de projetos. Para isso, vamos apresentar um pouco sobre algumas das principais ferramentas e métodos utilizados para auxiliar no desenvolvimento dessas atividades.

É importante compreender que as ferramentas e os métodos se adaptam de maneira diferente aos diversos tipos de projeto, portanto, cabe ao gestor buscar compreender quais proporcionam maior agilidade e garantem os melhores resultados de acordo com os objetivos propostos. A utilização correta de ferramentas e métodos permite uma visão completa do projeto e facilita compreender suas particularidades e sua evolução.

CONTEXTUALIZANDO

Vamos compreender um pouco sobre análise de viabilidade, perspectiva de retorno e demanda por gerenciar o projeto com excelência. Para isso, leia o texto disponível em: <<http://eshoje.com.br/empreendimento-milionario-fabrica-de-mdf-comeca-a-operar-em-fevereiro-em-pinheiros/>>.

Esse texto nos sugere um exemplo de projeto que passou por uma análise econômica, financeira e ambiental. Há elementos que demonstram a leitura de condições de mercado e de cadeia produtiva que comprovam uma realidade de mercado, proporcionando aos *stakeholders* compreender a oportunidade do projeto, com sua correta estimativa de investimento e previsão de retorno, trazendo confiabilidade.

Da mesma forma que o projeto demonstra viabilidade, ele precisa ser gerenciado de modo a garantir o retorno proposto, sem ultrapassar os valores estimados de investimento. Para isso, deverá contar com um bom gerente de projetos, uma equipe bem estruturada, além de utilizar-se de ferramentas e métodos que possibilitem aferir o planejamento e executar adequadamente, respeitando o tempo e os custos propostos.

TEMA 1 – ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA E AMBIENTAL

A análise de viabilidade do projeto é extremamente importante, uma vez que a visão organizacional nos remete a um investimento que deve proporcionar retorno ao longo de um prazo pré-definido.



Os projetos estão diretamente ligados ao processo de análise e decisões de investimento, uma vez que eles são a organização das informações para se atingir um objetivo futuro, com suas características e particularidades, envolvendo informações do ambiente interno e externo da organização.

Neste momento, vale lembrar que a função máxima de toda empresa é a obtenção de lucro, ou seja, retorno sobre o investimento, sendo o fator econômico um dos três elementos da sustentabilidade (econômico, social e ambiental) em negócios. O lucro é diretamente afetado pelo tempo; como exemplo, um retorno de 10% sobre um investimento em um mês pode ser considerado bastante atrativo, em um ano é muito pouco atrativo, e em três anos é extremamente negativo.

Mesmo em projetos que não nos parecem gerar entradas financeiras, nós temos essa percepção de investimento em retorno, como no caso do projeto de implantação de um *software* em uma empresa, que gera o desembolso (investimento) e produz resultados que diminuem os custos ou melhoram o processamento de atividades da empresa a partir de um determinado momento no tempo.

Um grande desafio nos projetos é obter um planejamento completo e imparcial, para que se possa precisar qual será o investimento total, e estimar corretamente o retorno a ser obtido. O projeto vai ser concebido nos conceitos estratégicos da organização, suas atividades vão sendo desenvolvidas, direcionando ao nível tático, no qual se identifica a viabilidade, para então ser detalhado e direcionado à execução e implantação (Woiler; Matias, 1996, p. 29 citado por Carvalho Junior, 2012, p. 77).

Os elementos da estrutura do projeto abordados na Aula 2, Temas 2, 3 e 4 apresentam as fontes de informações que permitem compreender como serão elaboradas as informações financeiras do projeto. Esses conjuntos constituem o plano de negócios, que deverá conter as saídas de caixa (investimentos) e as entradas (retorno). As entradas podem também chegar ao projeto como forma de economia em comparação aos meios utilizados anteriormente.

É extremamente importante que o projeto tenha sua estrutura elaborada de forma completa, imparcial, para que possa refletir estimativas de investimento e retorno reais.



O orçamento completo somente é finalizado após a conclusão de todas as etapas de planejamento, pois precisa de nível de detalhes de acordo com o que apresentamos sobre a decomposição das atividades em pacotes de trabalho (tarefas realizáveis), que permitirão compreender o tempo, os recursos e os custos totais envolvidos.

As estimativas econômicas e sobre o ambiente são fundamentais para que se possa estabelecer a previsão de retorno, e permitem calcular indicadores de rentabilidade e retorno sobre o investimento.

Os gestores e executivos envolvidos com a aprovação do projeto devem utilizar esses indicadores, bem como a análise por meio do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e *Payback* (tempo de retorno) para analisar a viabilidade do projeto.

Como entendimento complementar, em muitos casos as empresas criam alternativas de projetos e analisam dentre eles qual proporciona os melhores resultados, a fim de direcionar os investimentos de acordo com seus interesses. Os indicadores citados permitem essa comparação, pois colocam os resultados no mesmo patamar.

Projetos que não atendem às especificações de retorno estabelecidas no planejamento estratégico proporcionam risco excessivo, e por isso devem ser ajustados para que possam passar por nova análise, ou descartados para não prejudicar os resultados organizacionais.

Saiba mais

Acesse o vídeo do Youtube que trata a Análise de Viabilidade de Projetos, disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=NUgWVfrS85Q>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

TEMA 2 – PROJECT MODEL CANVAS

Em todas as áreas de gestão é comum a utilização de modelos gráficos para a apresentação de resultados ou de outros elementos que serão utilizados para a tomada de decisão.

A utilização de modelos gráficos permite uma melhor compreensão sistêmica, trazendo clareza e objetividade para as situações apresentadas, e permitindo que o gestor tanto possa tomar as decisões como realizar as correções necessárias para atingir os objetivos.




Os modelos Canvas vêm sendo aplicados às áreas de gestão por tratar um mapeamento integral dos conceitos envolvidos e proporcionar a visão de todos os elementos principais a serem gerenciados. A palavra *canvas*, do inglês, significa roupa ou modelagem, trazendo este conceito de que vamos descrever tudo o que envolve o projeto.

O Project Model Canvas foi criado em 2013, por José Finocchio Junior, e é embasado no Business Model Canvas, criado em 2010 pelo autor Alexander Osterwalder, utilizado para o desenvolvimento de ideias de negócios, na fase de concepção da ideia, que precede a elaboração de um plano de negócios.

A principal diferença entre o Project Model Canvas e o plano de gerenciamento de projetos é que o Canvas é apresentado em uma página única, para permitir a visão do todo, enquanto o plano de gerenciamento é um documento descritivo, bastante extenso e que pode apresentar alguma dificuldade quando ocorre demanda por modificações ou atualizações.

A ilustração a seguir representa o modelo proposto por Finocchio Junior, no qual podemos observar que os elementos fundamentais que estamos discutindo em nossas aulas estão organizados em um único modelo, permitindo compreender a correlação entre os diversos itens.

Figura 1 – Project Model Canvas

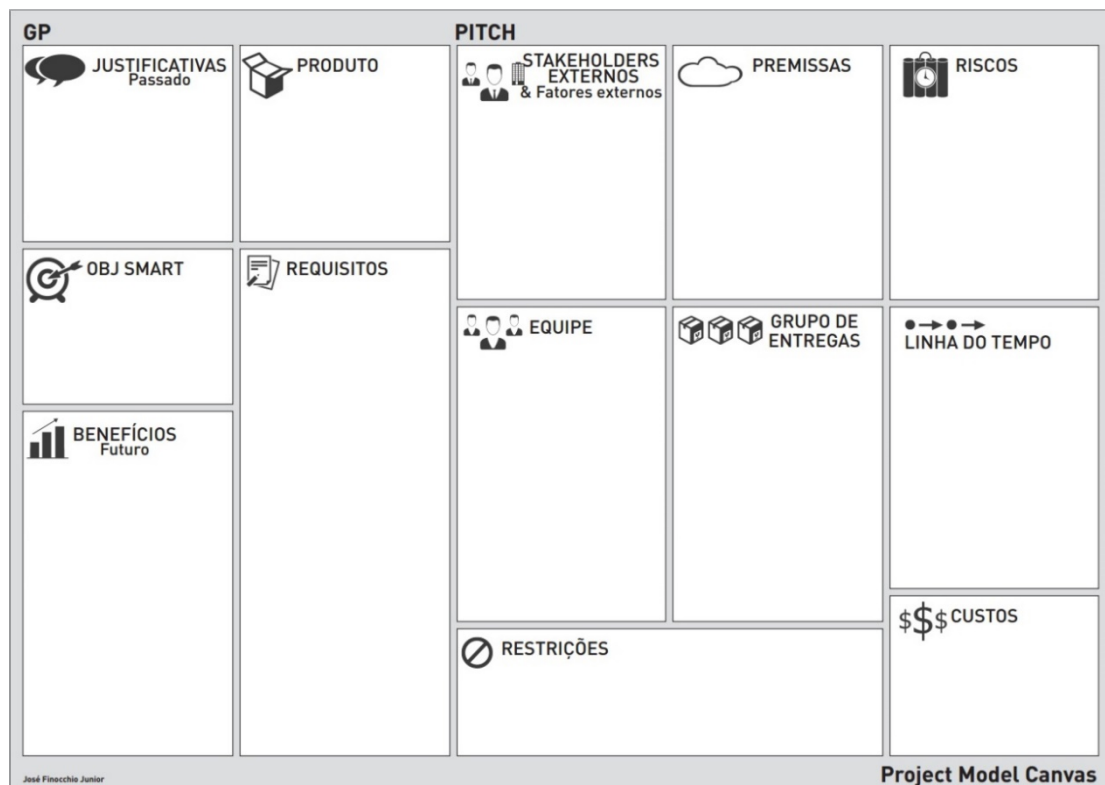

Fonte: Finocchio Junior, s.d.



A lógica de leitura do Project Model Canvas nos remete a compreender as principais perguntas que envolvem as demandas por gerenciamento e, com isso, proporciona ao gestor agilidade para a tomada de decisão. Observe na figura a seguir como podemos subdividir essa leitura.

Figura 2 – Project Model Canvas: perguntas



Fonte: <<http://danielettinger.com>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

O Project Model Canvas permite também um gerenciamento muito mais colaborativo, uma vez que todos os envolvidos podem compreender o conjunto completo do projeto, além da facilidade para atualizações.

Saiba mais

Acesse o *site* do Project Model Canvas (Disponível em: <<http://pmcanvas.com.br>>. Acesso em: 20 dez. 2017.) Para conhecer um pouco mais sobre ele. Neste *site* você encontra vídeos, leitura e pode fazer o *download* do modelo.

TEMA 3 – SCRUM (METODOLOGIA ÁGIL)



A globalização e os avanços tecnológicos geram ainda mais demanda por novos projetos nas organizações. O tempo de resposta desses projetos tem que ser muito rápido, tanto para manter a utilidade do produto do projeto ao atender o mercado, quanto pela relação investimento e retorno que abordamos no tópico anterior.

Nesse contexto de resposta, as metodologias ágeis vieram para ajudar os pequenos projetos ou pequenas empresas, que não adotavam planejamento e documentação pelos modelos não satisfazerem às suas demandas. Para outras empresas, adaptar ou até mesmo criar os próprios processos foi a melhor solução. Em 2001, surgiram os conceitos de metodologias ágeis, transferindo a ênfase do projeto do planejamento para a execução (Foggetti, 2014, p. 4).

As chamadas metodologias ágeis não trazem coisas novas, elas apresentam a mesma estrutura das metodologias tradicionais, mas com foco diferente, conforme podemos ver na comparação a seguir, apresentada por Foggetti (2014, p. 7):

Tabela 1 – Metodologias ágeis e metodologias tradicionais

Metodologia ágil	Metodologia tradicional
Foco nas pessoas	Foco nos processos
Usa mais tempo na implementação	Gasta mais tempo com documentação
Vai sendo adaptada no decorrer do projeto	Tenta prever tudo que acontecerá no projeto
Aceita a mudança	Prevê o futuro
É usada quando os requisitos são mais dinâmicos	É usada para requisitos estáveis e previsíveis
É usada quando o cliente não sabe bem o que quer	É usada quando o cliente tem certeza do que quer
Entrega em partes	Entrega de uma só vez

Desenvolvido por Ken Schwaber e Jeff Sutherland, o Scrum é uma metodologia ágil, com características que a fazem ser útil para aplicação em projetos nos quais os requisitos mudam muito rapidamente. Embora o Scrum não tenha técnica específica para desenvolvimento, ele apresenta um conjunto de regras e práticas de gestão, conforme mostra o quadro a seguir (Foggetti, 2004, p. 13).



Quadro 1 – Conjunto de regras e práticas de gestão do Scrum

Backlog do produto – reuniões realizadas com todos os participantes para levantar as necessidades do que vai ser criado.
Reuniões diárias (daily scrum) – esta reunião também é chamada de <i>stand up meeting</i> , já que é realizada rapidamente e em pé. Nestas reuniões, três perguntas são respondidas por cada membro da equipe: 1- O que foi feito ontem? 2- O que será feito hoje? 3- Há algum obstáculo para realizar as atividades?
Sprint – é o período que a equipe tem para executar o que foi combinado no <i>backlog</i> do produto. Normalmente, dura de uma a quatro semanas, mas isso não é uma regra.

Fonte: Foggetti, 2004, p. 13.

O conceito básico do Scrum vem do Rugby, correspondendo ao local onde os jogadores se reúnem para planejar a próxima rodada, por isso a metodologia considera pequenas partes do projeto, com *Sprint* ou intervalos de até 30 dias (Foggetti, 2004, p. 39). Veja os artefatos do Scrum:

Quadro 2 – Artefatos do Scrum

Product backlog – é um documento mutável, definido pelo cliente no início do projeto, no qual estão as funcionalidades esperadas e em ordem de prioridade.
Sprint backlog – documento gerado na reunião de planejamento, que divide o <i>product backlog</i> em pedaços para a implementação.

Fonte: Foggetti, 2004, p. 39

Neste contexto, percebemos que os projetos são divididos em ciclos (*sprints*), com intervalos aproximados de um mês, e devem ser gerenciados com interatividade, sempre mantendo documentação adequada ao modelo.

Saiba mais

Assista ao vídeo do YouTube que detalha a metodologia Scrum, disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=XfvQWnRgxG0>>. Acesso em: 20 dez. 2017.



TEMA 4 – *SOFTWARES* DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

A tecnologia da informação vem sendo uma aliada bastante grande dos gestores em todas as suas áreas de atuação. A demanda por resposta rápida, por precisão e por controle imparcial das informações faz com que os *softwares* estejam cada vez mais presentes no dia a dia do gestor.

Diversas são as opções de *softwares*, com funções distintas, com facilidades ou custos diferentes. O gestor deve estar atento às diversas opções do mercado para poder utilizar sempre as ferramentas que melhor se adaptam às suas necessidades.

Há opções de *softwares* livres (gratuitos) que atendem muito bem a diversas demandas, assim como em outros casos o gestor vai identificar a necessidade de adquirir licença para uso de *softwares* comerciais.


A principal função dos *softwares* de gerenciamento de projetos é permitir descrever cada uma das atividades para realização, atribuindo recursos e tempo, e possibilitando interpretar as dependências entre as atividades.

Como resultado, são apresentados os relacionamentos dessas atividades em um diagrama, além do Gráfico de Gantt, que permite ao gestor compreender em que momento do tempo cada tarefa deverá ser realizada.

Ao longo da realização das atividades, o gestor irá indicar o progresso de cada tarefa e compreender como as alterações vão impactar nos resultados finais do projeto.

Veja na figura a seguir um exemplo de tela do *Microsoft Project*, na qual podemos observar a organização de tarefas e a geração do Gráfico de Gantt.


Figura 3 – Gráfico de Gantt

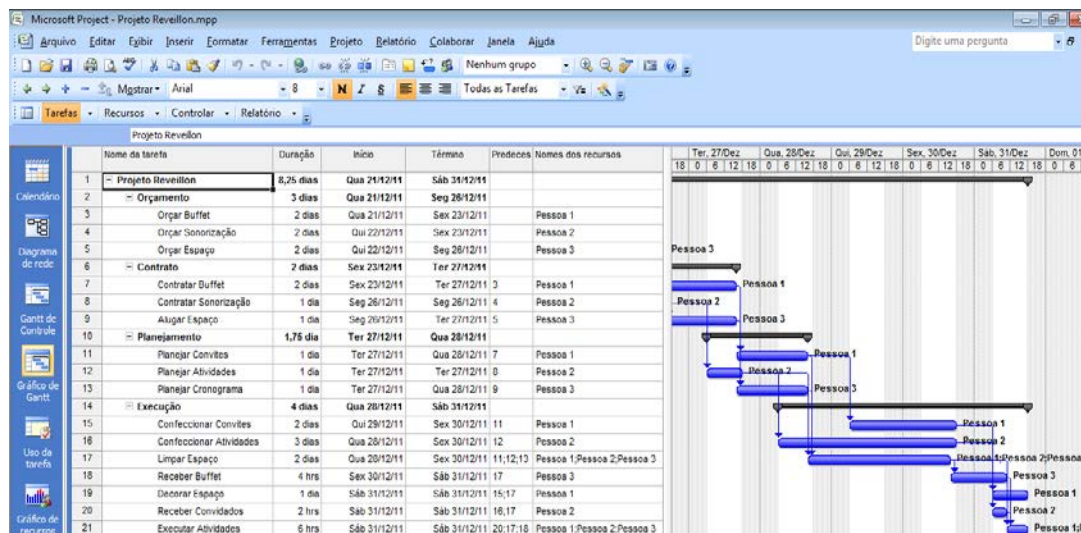

Fonte: TI in Foco, s.d.

Outro exemplo de aplicação é o *software* BrickControl, que, como vemos a seguir, tem funções muito similares ao do *MS Project*.

Figura 4 – Tela do *software* BrickControl

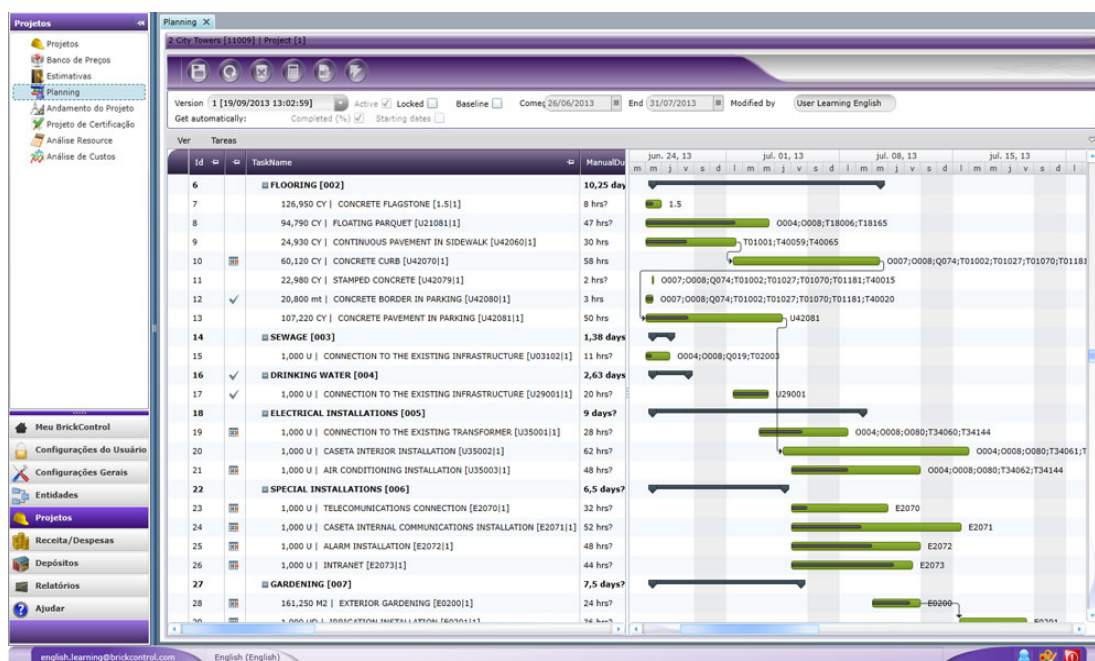


Fonte: *BrickControl*

Outros tipos de *software* são comumente usados por gestores de projetos, como exemplo dos *softwares* para criação de mapas mentais e mapas conceituais, que são utilizados nas fases iniciais do planejamento e na concepção do projeto. Veja na figura a seguir um exemplo de mapa conceitual

que descreve funções básicas de um *software* de controle de estoque, em que um tema central é subdividido em suas partes para compreensão:

Figura 5 – Mapa Conceitual

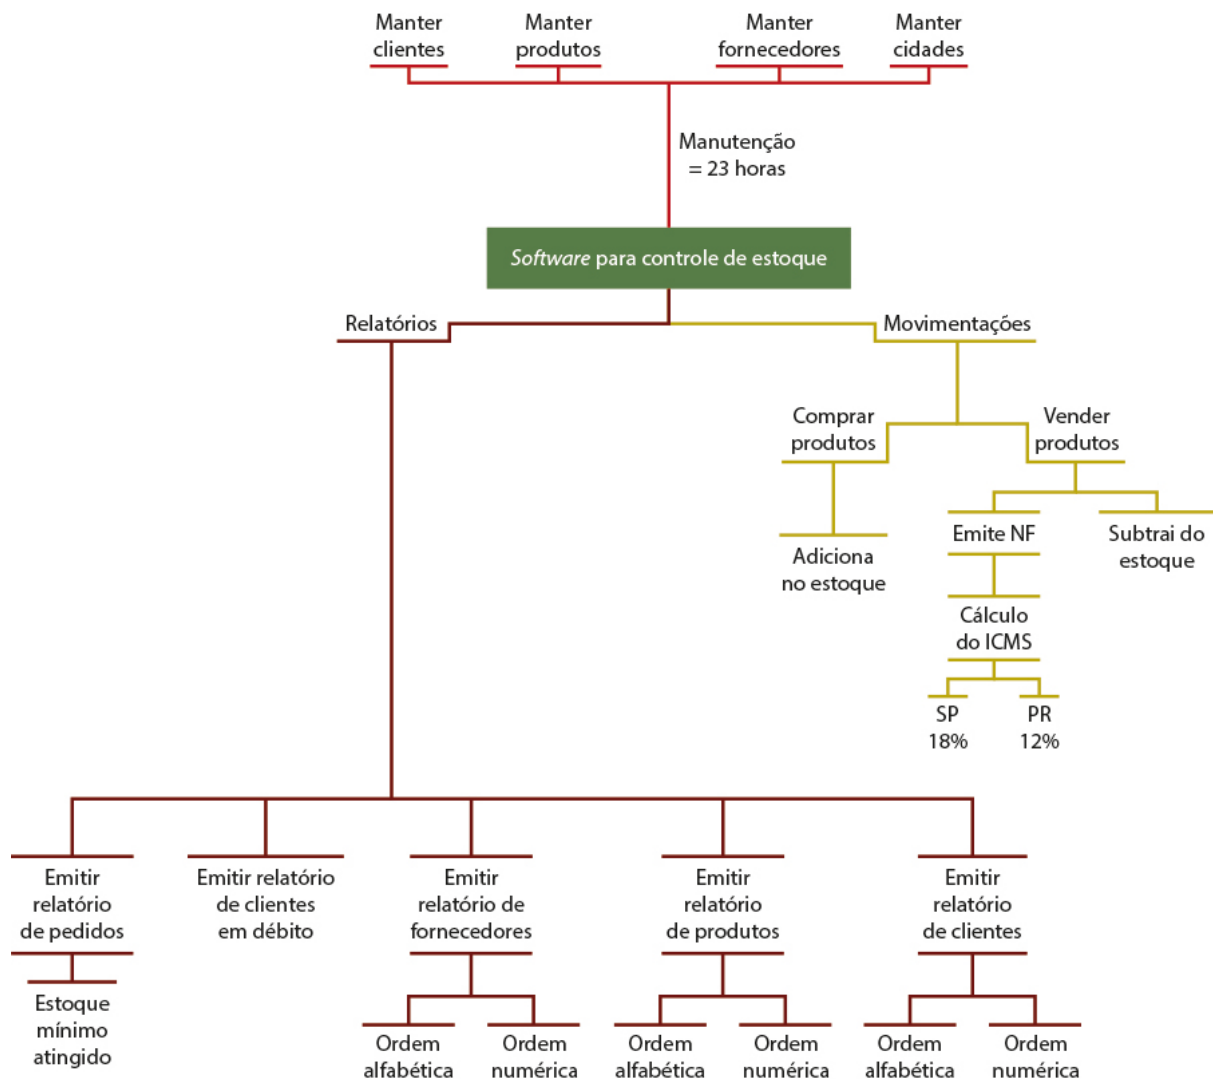

Fonte: Fabri, s.d.

Os *softwares* de Mapas Mentais e Mapas conceituais costumam ser utilizados para a construção da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), pois com sua utilização é possível compreender a decomposição das tarefas em suas atividades executáveis.

Há diversos outros *softwares* relacionados à Gestão Ágil de Projetos. Também, em alguns casos, até mesmo o Excel pode auxiliar o gestor, que pode desenvolver planilhas para controlar as tarefas. Assim, o que podemos perceber é que diferentes projetos podem demandar ferramentas diferentes, de acordo com seu tamanho e complexidade, e o gestor deve compreender como organizar a utilização de cada uma.



Saiba mais

Acesse o *site* disponível em: <<https://blog.luz.vc/como-fazer/como-escolher-um-software-de-gestao-de-projetos/>> (Acesso em: 20 dez. 2017) e veja um pouco mais sobre os *softwares* para gestão de projetos.

TEMA 5 – LIÇÕES APRENDIDAS

Já comentamos a importância de, ao longo de todo o projeto, criar um conjunto completo de documentos que contemple todo o planejamento e os registros de desempenho das tarefas. Todas as informações devem ser registradas e documentadas corretamente para permitir compreender os resultados e as distorções.

Os registros de informações também são utilizados em muitos casos para resguardar questões legais, ou para proporcionar respaldo a negociações quando necessário, pois explicam os fatores que geraram alterações ao longo da execução do projeto. Aqui, vale notar, que nem sempre as alterações ocorrem por erros nos projetos, porque muitas vezes elas acontecem por solicitação de mudanças por parte das partes interessadas.

As lições aprendidas consistem no conjunto de informações sobre os erros e acertos, devidamente organizadas, compondo informações sobre práticas recomendadas e a serem evitadas, que proporcionarão o sucesso ou o fracasso do projeto, como fruto da experiência para uso futuro (Valeriano, 2001, p. 97).

É imprescindível que a administração busque meios eficazes para compor e divulgar as lições aprendidas (Valeriano, 2015, p. XXIV), proporcionando menores riscos e custos nas tarefas e/ou projetos seguintes.

Portanto, as lições aprendidas devem ser catalogadas, avaliadas, armazenadas e difundidas a todos os participantes do projeto (Valeriano, 2001, p. 97). Valeriano apresenta também que a metodologia para identificar erros e acertos consiste basicamente nos dois processos descritos por ele, demonstrados no quadro a seguir:



Quadro 3 – Metodologia para identificar erros e acertos

1- Proceder a uma avaliação crítica no término de cada projeto ou no fim de cada importante fase dos projetos mais longos, para levantar os erros e acertos, e principalmente, suas causas, aprendendo assim as lições oferecidas pela experiência. Estas avaliações geralmente contam com elementos estranhos ao projeto, com suas experiências anteriores, e suficiente isenção, para detectar fatos que poderiam passar despercebidos pelo pessoal do projeto.

2- Elaboração de um questionário a ser preenchido pelos gerentes e membros de sua equipe, periodicamente recolhidos para análise, avaliação e adoção. O questionário deve orientar para fatos e resultados relevantes observados, ocorridos, ameaçados, prevenidos etc. e seus resultados (positivos ou negativos). A escolha de palavras-chave permite agrupá-los para facilitar a recuperação e o exame posteriores.

Essas lições devem proporcionar uma tomada de decisão mais rápida conforme o projeto evolui, e também conforme a maturidade da organização em seus projetos.

Saiba mais

Leia o texto sobre a importância de documentar as lições aprendidas no projeto, disponível em: <<https://www.projectbuilder.com.br/blog-pb/entry/blog-gestao-de-projetos/a-importancia-de-documentar-as-licoes-aprendidas-no-projeto>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

TROCANDO IDEIAS

Vamos debater sobre os itens estudados, tirar as dúvidas e ampliar o conhecimento adquirido. Em nosso Fórum, discutiremos os seguintes itens:

- Quais os elementos básicos para análise da viabilidade de projetos?
- O que difere o Project Model Canvas do Plano de Gerenciamento Do Projeto?
- O que são metodologias ágeis para gestão de projetos?
- Por que o gestor de projetos deve analisar a demanda para escolher os *softwares* que irá utilizar para o gerenciamento?
- Como as lições aprendidas podem contribuir em projetos futuros?

Assista ao vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=2NAyTUt-amo>. Acesso em: 20 dez. 2017.

Analise o vídeo apresentado e procure comparar com os demais projetos que você já viu em nossos exemplos ou pensou em decorrência do contexto de seu dia a dia. Pense com as questões apresentadas nas explicações sobre o Canvas: Por que o projeto será realizado? O que é o projeto? Quem realizará as etapas do projeto (*stakeholders* e equipe)? Como o projeto será realizado? Qual o tempo, custo e riscos envolvidos?

FINALIZANDO

Esta aula apresentou alguns dos elementos fundamentais que o gestor de projetos precisa para conduzir as atividades e garantir o sucesso do projeto.

Inicialmente, não há como conseguir aprovação de um projeto se não for constatada sua viabilidade, uma vez que as organizações estão sempre considerando a resposta de retorno sobre investimento. Para a análise da viabilidade, o conjunto de informações econômicas e ambientais deve ser imparcial e deve conter as possíveis variações, riscos e incertezas.

Para o desenvolvimento do planejamento do projeto, vimos que o Project Model Canvas é uma ferramenta para modelagem do projeto, que apresenta de forma gráfica a totalidade do projeto em uma tela única, que representa todas as principais informações a serem conduzidas no desenvolvimento.

Ainda, foi abordado que cada vez mais a demanda por resposta rápida está presente nos projetos, por isso, as metodologias ágeis se fazem necessárias, como o Scrum, que divide o projeto em ciclos aproximados de um mês, fazendo com que dentro desses ciclos ocorra uma interatividade maior para a realização das tarefas.

Também os *softwares* auxiliam tanto para essa resposta rápida quanto para a abrangência de controle, proporcionando agilidade na leitura de modificações, bem como o entendimento da totalidade do projeto, e o uso de recursos e tempo envolvidos.

Por fim, percebemos a importância da integração de todos os elementos estudados, pois eles contribuem com a visão do todo e a documentação do projeto, facilitando o registro das lições aprendidas, que devem ser utilizadas



nas fases ou nos projetos seguintes, para melhorar o potencial de acertos e a velocidade de resposta nos projetos.



REFERÊNCIAS

CARVALHO JUNIOR, M. R. **Gestão de projetos**: da academia à sociedade. Curitiba: InterSaberes, 2012.

FOGGETTI, C. **Gestão ágil de projetos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

PMBOK. **A guide to the project management body of knowledge**. 3. ed. Newtown Square, PA: PMI – Project Management Institute, 2004.

VALERIANO, D. L. **Gerenciamento estratégico e administração por projetos**. São Paulo: Makron, 2001.

_____. **Moderno gerenciamento de projetos**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
